


PROCEDURE UITVOERINGSFASE

Datum: 28 april 2016

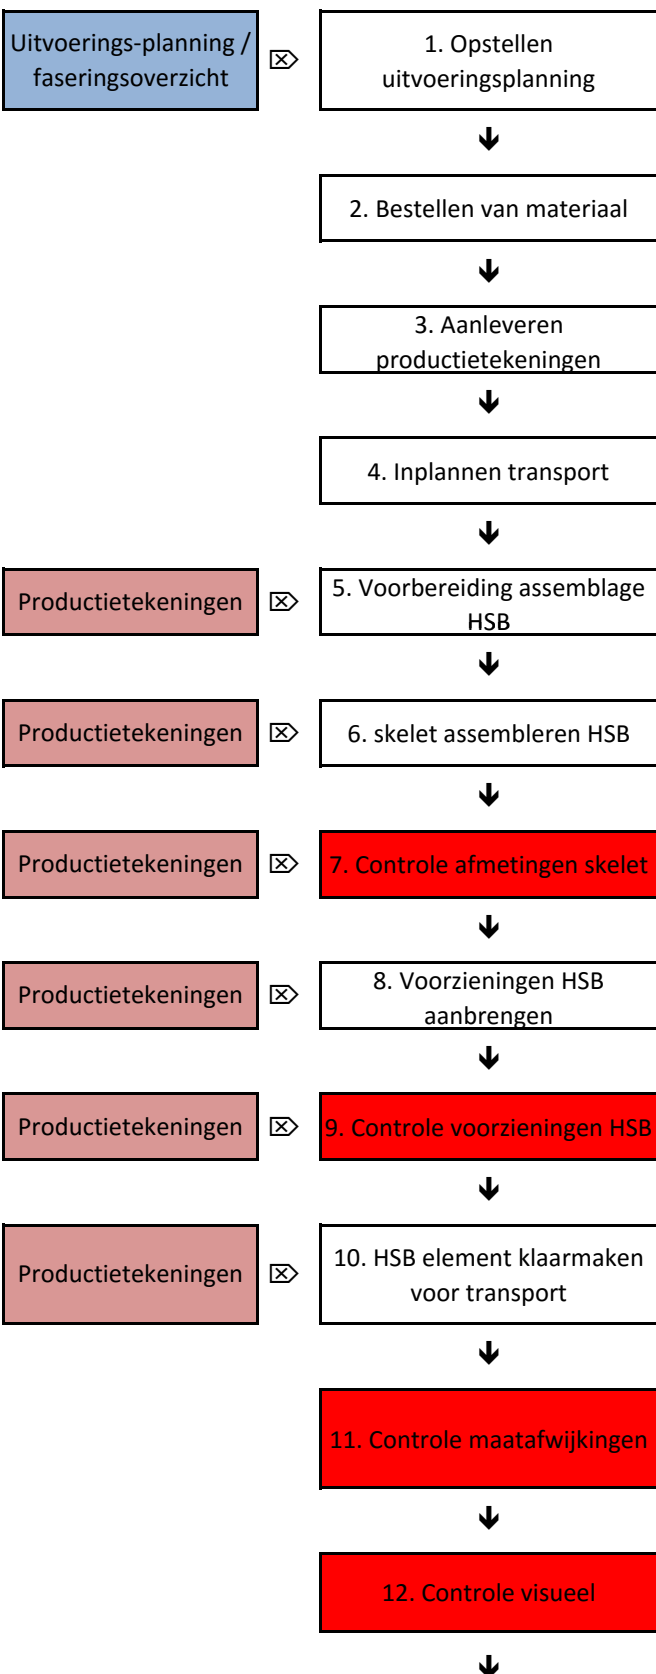

(Hoofd) projectleiding

Maakt uitvoeringsplanning en faseringsoverzicht in overleg met opdrachtgever

(Hoofd) projectleiding

Besteld materiaal op basis van uitvoeringsplanning

(Hoofd) projectleiding

Levert productietekeningen en werkvolgorde aan productie

Hoofd productie

Plant in overleg met (hoofd) projectleider het transport

Productieleider - productiemedewerker

Kort hout af, nummert het en legt het klaar voor verwerking

Productieleider - productiemedewerker

Assembleert HSB-skelet met stijlen en regels

Productieleider - productiemedewerker

Controleert afmetingen skelet

Productieleider - productiemedewerker

Brengen voorzieningen aan als folies, isolatie, elektradozen, e.d.

Productieleider - productiemedewerker

Controleert voorzieningen element

Productieleider - productiemedewerker


Maakt HSB element klaar voor transport en nummert het element

Productieleider - productiemedewerker

Controleert de HSB-elementen op maatafwijkingen en legt dit vast middels een sticker op het element

Hoofd productie

Voert visuele controle uit op HSB-elementen

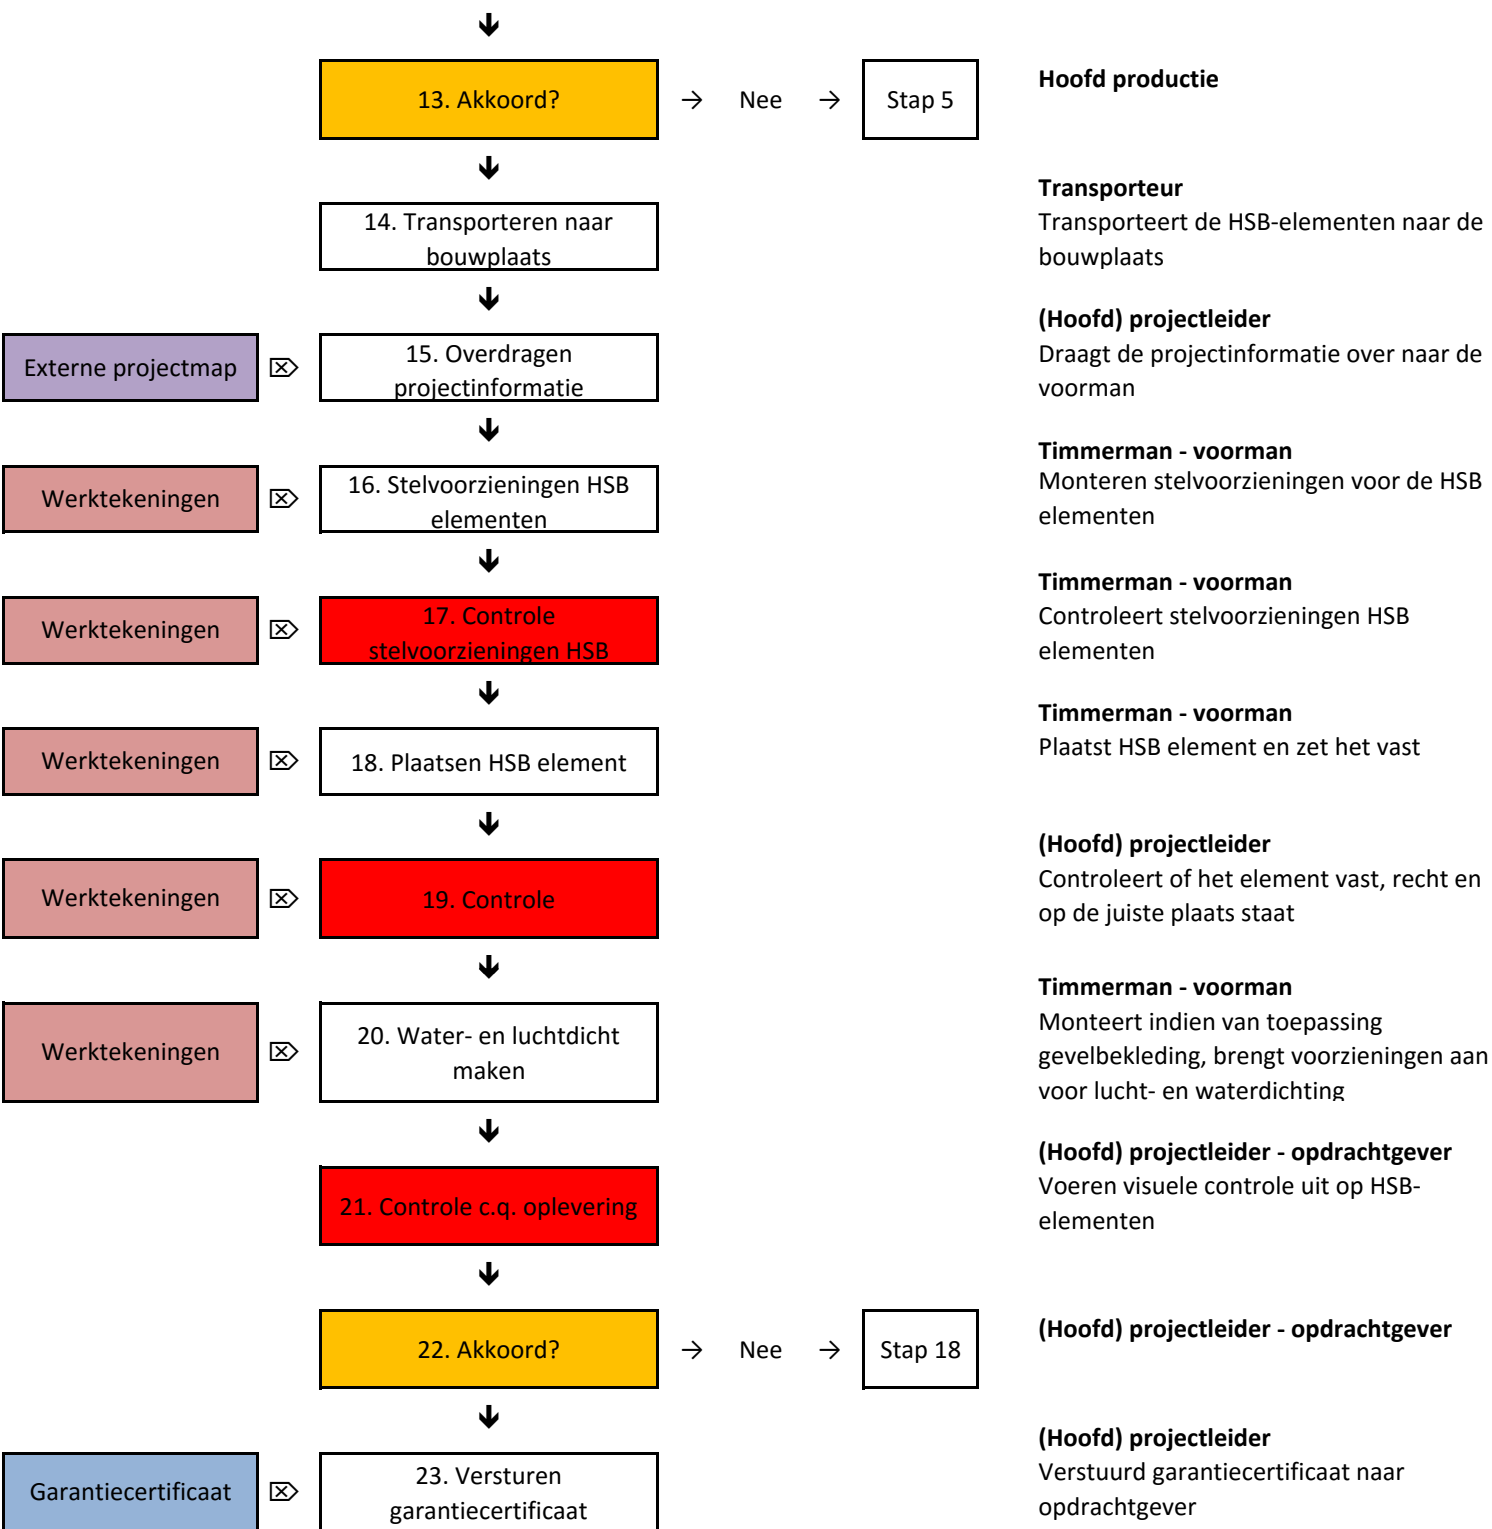

Hoofd productie

Transporteur

Transporteert de HSB-elementen naar de bouwplaats

(Hoofd) projectleider

Draagt de projectinformatie over naar de voorman

Timmerman - voorman

Monteren stelvoorzieningen voor de HSB elementen

Timmerman - voorman

Controleert stelvoorzieningen HSB elementen

Timmerman - voorman

Plaatst HSB element en zet het vast

(Hoofd) projectleider

Controleert of het element vast, recht en op de juiste plaats staat

Timmerman - voorman

Monteert indien van toepassing gevelbekleding, brengt voorzieningen aan voor lucht- en waterdichting

(Hoofd) projectleider - opdrachtgever

Voeren visuele controle uit op HSB-elementen

(Hoofd) projectleider - opdrachtgever

(Hoofd) projectleider

Verstuurd garanticertificaat naar opdrachtgever

- Processtap
- Programma
- Bestand
- Map
- Tekeningen

- Controle moment
- Beslismoment
- Volgende procedure
